



東広島高田道路 安全協議会だより



東広島高田道路建設工事現場より

早春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、現在進行中の工事につきまして、以下の通り進捗状況をご報告いたします。

皆さまのご協力により工事は順調に進んでおり、東広島高田道路の一日も早い完成を目指して全力で取り組んでおります。

今後も安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めて参ります。

何かご不明点やご意見がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。 工事に関するお問い合わせ先は、右上の通りでございます。

寒暖定まらぬ時期ですので、体調を崩されませんようご注意ください。

引き続きご理解とご協力をお願い申し上げますと共に、益々のご発展をお祈り申し上げます。



「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者		令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	2月末現在 進捗率	各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。
吉田工区①	国道54号 交差点改良	高田舗道(有)	予定								45.6%	
			実施								47.0%	
全工区①	安全施設設置	宮川興業(株)	予定								95.0%	
			実施								85.5%	
全工区②	標識設置	(株)東伸	予定								85.0%	
			実施								80.0%	
全工区③	道路改良 舗装	富田組(株)	予定								20.0%	
			実施								13.0%	
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定								100.0%	
			実施								98.0%	
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定								98.0%	
			実施								98.0%	
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定								99.5%	
			実施								99.5%	
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック一心	予定								98.0%	
			実施								98.0%	
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定								100.0%	
			実施								100.0%	
正力工区	トンネル内電波基地局	(株)きんでん	予定								70.0%	
			実施								65.0%	

裏面へ続く

作成代表者

〒731-0501



広島県安芸高田市吉田町吉田3266-1

高田舗道 有限会社

0826-42-2027

<https://takatahodou.com>

工事に関する
問い合わせ先

広島県北部建設事務所 工務第二課

電話:0824-63-5181(担当:寛・石原)

広島県 土木建築局 営繕課

電話:082-513-4198(担当:磯道・平岡・永井)



進捗状況


吉田側坑口より



正力側坑口より



主に坑内機器取付・ケーブル敷設・接続、区画線設置、電気室工事、54号線を施工中です。

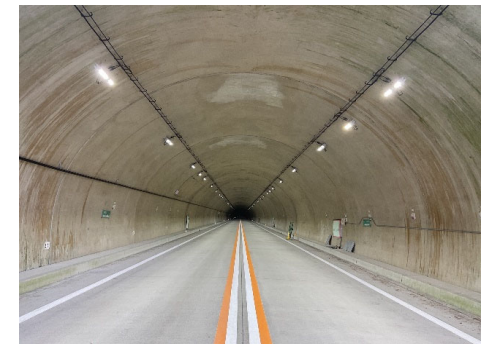

坑内の状況



東広島高田道路に於ける進捗状況(2025年2月末現在)

正力工区全体



吉田工区①

担当業者: 高田舗道(有)



国道54号線と
東広島高田道路の
交差点改良工事



正力工区

担当業者: (株)きんでん



トンネル電波基地局



トンネル工区①

担当業者: 塩田工業(株)



消火栓は全て
取付完了です。

非常用設備
(消火栓等)
の工事



全体図



トンネル工区②

担当業者: (株)日立インダストリアル
プロダクツ 中国営業所



ジェットファンは
全て取付完了です。

換気設備
の工事




トンネル工区③

担当業者: 大亜工業(株)



電気設備
(トンネル照明等)
の工事

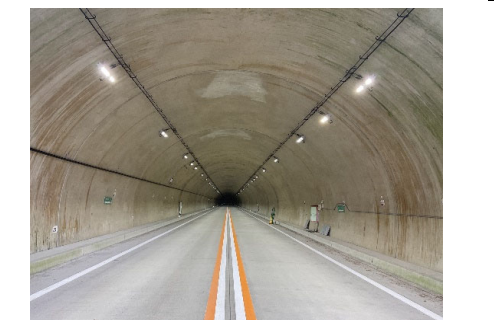


全工区①

担当業者: 宮川興業(株)



安全施設設置

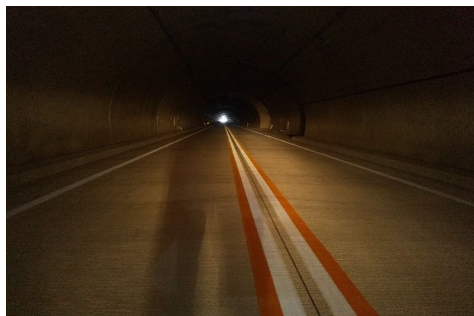

全工区②

担当業者: (株)東伸



標識設置



全工区③

担当業者: 富田組(株)



道路改良
舗装



トンネル工区④

担当業者: (株)メディアテックー心



警報表示板は全て取
付完了です。

警報表示板・
非常電話設置等
の工事

