

工事のお知らせ ~2021年12月号~

前田・寄神・青木
 特定建設工事共同企業体
 〒739-1201
 安芸高田市向原町坂98-1



工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）
 工期： 自 令和2年12月17日 ～ 至 令和4年10月27日

○現場の状況



トンネル坑内状況



切羽（トンネル内の掘削箇所）状況



ヤード全景（トンネル坑口部）



ヤード全景（工事起点右側より）



ヤード全景（工事起点付近）



起点側付近盛土作業状況



排水路設置作業状況




排水路設置作業状況

○現在の進捗

令和3年11月末現在

| | 2年 | | 令和3年 | | | | | | | | | | 令和4年 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トンネル掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インバート工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 覆工コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土・道路工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 片付け工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

全体工程表

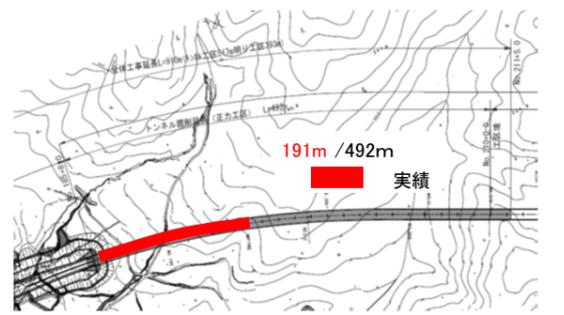


トンネル進捗図 11/29現在

○今月の作業予定

トンネル坑内では、インバートコンクリートを中心に工事を進めます。インバートコンクリートは下のトンネル標準断面図に示すように、トンネルの下の部分になります。今回は、連続して約100mの区間を施工する予定で、コンクリートの打設も10日程度行います。

明かり部は、盛土工事のほかに排水路の工事を行います。今月は、トンネル掘削で発生する土砂が少なくなるので、先月よりは場内での盛土工事に伴う土砂の運搬や盛土作業は少なくなります。

また、インバートコンクリートの施工に伴うコンクリートの搬入が、10日程度(日に15台程)あります。コンクリート搬入日は、誘導員を配置します。出入口部は、引き続きご注意ください。

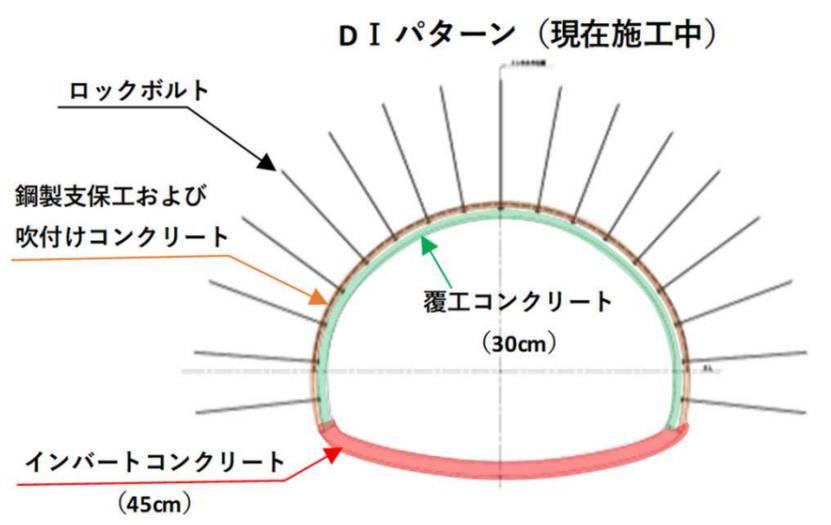

トンネル標準断面図
