

工事のお知らせ ~ 2022年6月号 ~

工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）
 工期： 自 令和2年12月17日 ~ 至 令和4年10月27日

前田・寄神・青木
 特定建設工事共同企業体
 〒739-1201
 安芸高田市向原町坂98-1



○現場の状況



仮設ヤード状況



坑内状況（防水工）



坑内状況（覆工コンクリート）



ヤード全景（トンネル坑口部）




ヤード全景（工事起点右側より）




ヤード全景（工事起点付近）

○現在の進捗

令和4年5月末現在

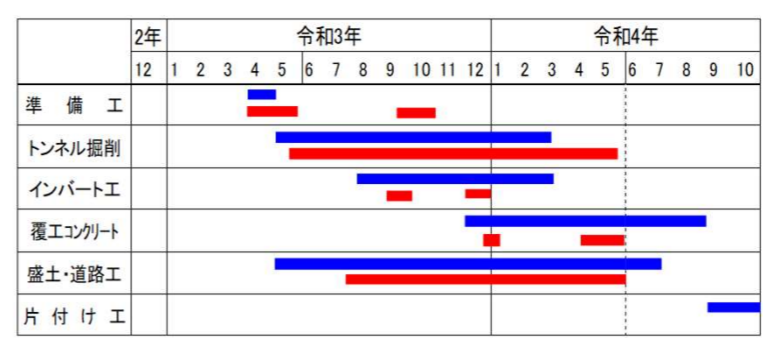

全体工程表

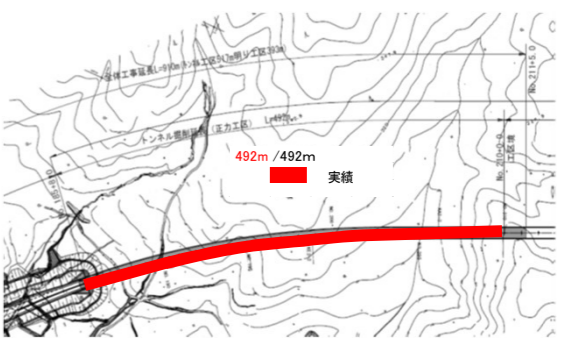

トンネル進捗図

○今月の作業予定

トンネル坑内における発破掘削によるトンネル掘削が5月30日完了しました。6月は、覆工コンクリート、インバートコンクリートの施工を実施します。
 また、トンネル掘削の仮設備の解体を、順次実施します。
 明かり部は、盛土工事の仕上げと、法面仕上げ、排水路の工事を引き続き行います。
 覆工コンクリート、インバートコンクリートに使用する生コンクリートの搬入が、向原方面より、ほぼ毎日（1日約30台程度）あります。6月における土砂の搬出については、現在調整しております。
 コンクリート搬入時、土砂搬出を行う時は、誘導員を配置しますが、ヤード入口付近は、ご注意願います。

○その他について

令和4年5月26日において、地元皆様との立会いのもと、（仮称）向原吉田トンネルが無事貫通いたしました。
 今後におきましても、発注者である西部建設事務所様のご指導のもと、この工事が無事完了するよう鋭意努力してまいります。
 引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。



トンネル貫通地点（向原側より）



トンネル貫通地点（吉田側より）
