

工事のお知らせ

～2022年8月号～

工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）

工期： 自 令和2年12月17日 ～ 至 令和4年10月27日

前田・寄神・青木
特定建設工事共同企業体

〒739-1201
安芸高田市向原町坂98-1

前田建設
YSC 寄神建設株式会社
YORIGAMI MARITIME CONSTRUCTION CO.,LTD.

A 青木組

○今月の作業予定


今月は、トンネル坑内で、覆工コンクリート、路盤整備、坑口部で坑門工（トンネルの入り口部分の斜面やトンネル部分を安定な状態にするための壁面状のコンクリート構造物）、トンネルの外の明かり部では、現在仮置きされている土砂の一部を、場外に搬出作業を実施します。

覆工コンクリートに使用する生コンクリートの搬入が、週に3回、一回につき約30台程度あります。また、上述の仮置き土砂の搬出は、盆明けの17日ごろより実施する予定で、1日に100台程度搬出します。期間は、約1か月で調整しています。

コンクリート搬入時、土砂搬出を行う時は、誘導員を配置しますが、ヤード入口付近は、ご注意ください。


○現在の進捗

令和4年7月末現在

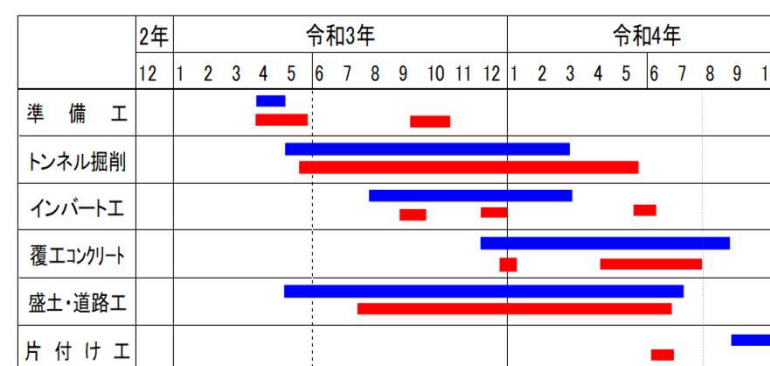


全体工程表

■ 計画
■ 実績

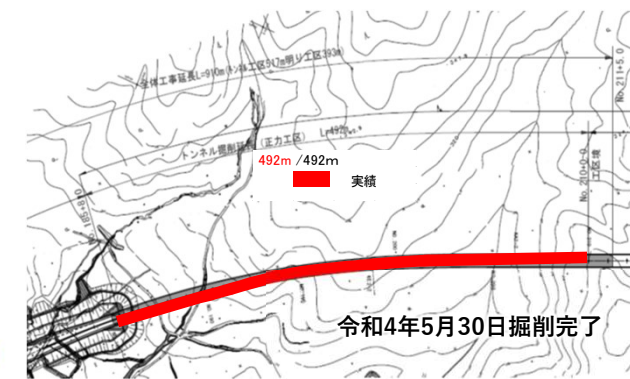

トンネル進捗図

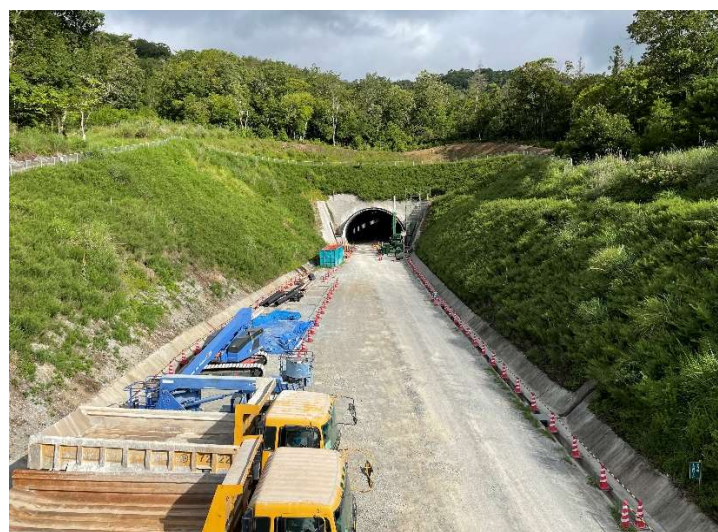

ヤード全景（坑口部）



ヤード全景（仮設ヤード）



ヤード全景（工事起点より）



ヤード全景（右側より）



覆工コンクリート施工場所



中央排水工施工状況



坑門工施工場所



仮置き土砂

○その他について

今月の13～16日については夏季に伴い作業を休止します。
その他、土曜日、日曜日以外は作業を実施します。

