

工事のお知らせ ~2022年5月号~

工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）
 工期： 自 令和2年12月17日 ~ 至 令和4年10月27日

前田・寄神・青木
 特定建設工事共同企業体
 〒739-1201
 安芸高田市向原町坂98-1



○現場の状況



仮設ヤード状況



切羽（トンネル内の掘削箇所）状況



ヤード全景（トンネル坑口部）



ヤード全景（工事起点右側より）



ヤード全景（工事起点付近）





トンネル坑内状況（覆工コンクリート）



トンネル坑内状況（中間付近）

○現在の進捗

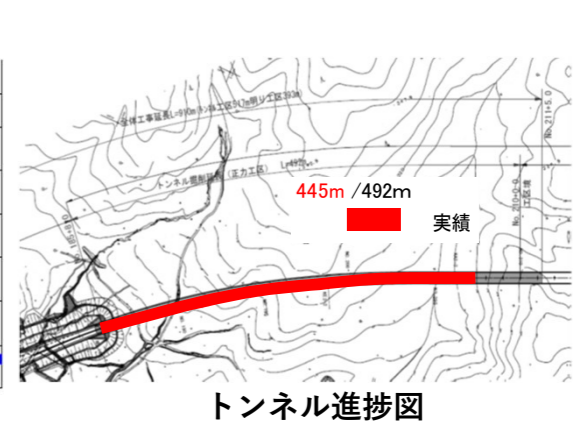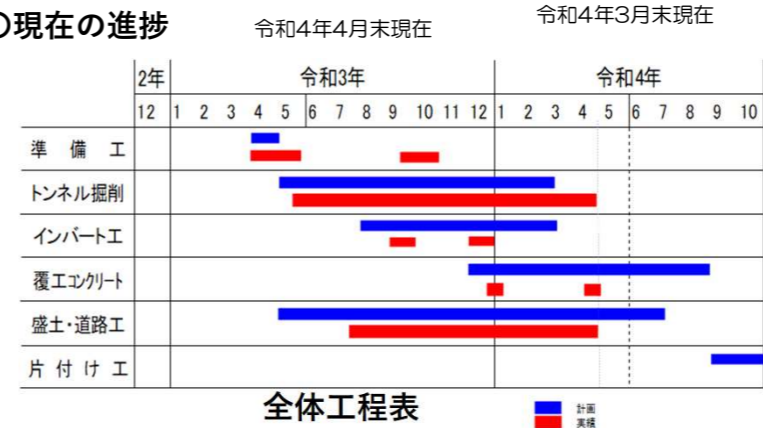

○今月の作業予定

トンネル坑内では、発破掘削によるトンネル掘削、覆工コンクリートの施工を、5月も継続して実施します。また、発生するズリ（トンネル掘削により発生する土砂）も、仮置き場内で破碎します。騒音、粉塵等に配慮して作業を行います。また、トンネル掘削の残りが、約50mとなりました。5月20日ごろに、貫通する予定です。

明かり部は、盛土工事と、法面仕上げ、排水路の工事を引き続き行います。通常のトンネル掘削の材料以外にも、覆工コンクリートに使用する生コンクリートの搬入が、向原方面より、2日に1回のペース（1日約30台程度）であります。5月末の土砂の搬出については、現在調整しております。コンクリート搬入時、土砂搬出を行う時は、誘導員を配置しますが、ヤード入口付近は、ご注意願います。

また、4月29日～5月8日は、ゴールデンウィークに伴い現場作業を休止します。

○その他について

前述いたしました、いよいよ（仮称）向原吉田トンネルが貫通します。具体的な日時が確定しましたら、お知らせいたします。

まずは、貫通まで気を引き締めて、環境や安全に配慮して工事を進めたいと思います。引き続き、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

4月より、環境保全のために設置している給水設備に加えて、下に示すB沢下流部においても、追加の設備（ポンプ、配管、発電機）を、広島県西部建設事務所において設置しています。こちらの設備に関しましても、当面の間、当JVにて管理いたします。何かお気づき等がありましたら、JVまで連絡いただきますよう、よろしくお願いします。

