

工事のお知らせ

～2022年1月号～

前田・寄神・青木
 特定建設工事共同企業体
 〒739-1201
 安芸高田市向原町坂98-1



工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）
 工期： 自 令和2年12月17日 ～ 至 令和4年10月27日

本年もよろしくお祈りします。

昨年、本工事に対するご理解、ご協力、誠にありがとうございました。
 本年は、工事完了の年となります。安全第一で工事を進め、無事に完了できるよう、職員一同、気を引き締めなおし、鋭意努力してまいります。
 引き続き、ご理解、ご協力いただきますよう、本年もどうか、よろしくお願いいたします。



令和4年元旦

前田・寄神・青木JV 向原吉田トンネル作業所
 作業所長 西増 宏文 他 職員一同

○現場の状況



トンネル坑内状況



仮設ヤード状況



ヤード全景（トンネル坑口部）



ヤード全景（工事起点右側より）




ヤード全景（工事起点付近）

○現在の進捗

令和3年12月末現在

	令和3年												令和4年											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
準備工																								
トンネル掘削																								
インパート工																								
覆工コンクリート																								
盛土・道路工																								
片付け工																								

全体工程表

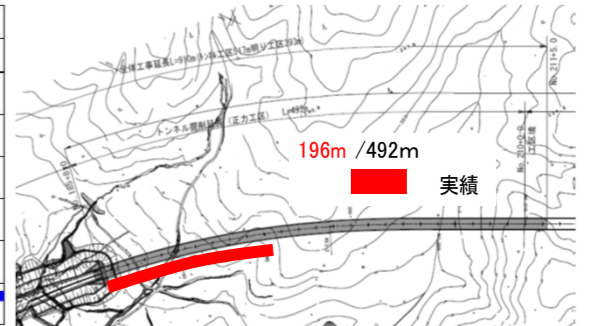

トンネル進捗図 12/25現在

○今月の予定

令和3年12月30日～令和4年1月3日は、冬季の作業休止となります。
 4日からの年始におきましては、年末からの継続作業のトンネル坑内での仮設備（覆工コンクリート用移動式型枠（通称セントル）組立）工事を実施します。
 発破によるトンネル掘削作業は、11日より再開します。
 明かり部におきましても、11日より水路および盛土作業を実施します。
 その他、中ごろより、トンネル掘削で発生した大きなズリを、特殊な破碎機により、細かくする作業を実施します。それに伴い大きなズリの場内における運搬作業等も行います。騒音や発生するほこりの対策を実施して、作業します。
 今月も、土砂の搬出等はありませんが、材料の搬入などがありますので、引き続き、出入口については、ご注意くださいようよろしくお願いいたします。

○工事ヤードの開放について

令和4年1月8日、9日に、正力地区の行事（とんど焼き）に伴い、右図に示す工事区域の一部を正力地区に解放いたします。
 工事用の資材や設備がありますので、ご注意願います。
 また、当日、トンネル付近において作業もしておりますので、解放場所以外への立ち入りは、ご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。

