

# 工事のお知らせ ~2022年7月号~

工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）  
 工期： 自 令和2年12月17日 ～ 至 令和4年10月27日

前田・寄神・青木  
 特定建設工事共同企業体  
 〒739-1201  
 安芸高田市向原町坂98-1



## ○今月の作業予定

トンネル掘削、インバートコンクリートが完了し、防水工、覆工コンクリート、中央排水工（トンネル内の湧水を坑口に排水する排水管）の施工を行います。

また、郊外においては、現在行っているトンネル掘削の仮設備の解体を順次行います。



明かり部は、盛土工事の仕上げと、法面仕上げ、排水路の工事を引き続き行います。

覆工コンクリートに使用する生コンクリートの搬入が、向原方面より、週に3回（1日約30台程度）あります。7月における土砂の搬出については、現在調整しております。

コンクリート搬入時、土砂搬出を行う時は、誘導員を配置しますが、ヤード入口付近は、ご注意ください。

## ○現在の進捗

令和4年6月末現在

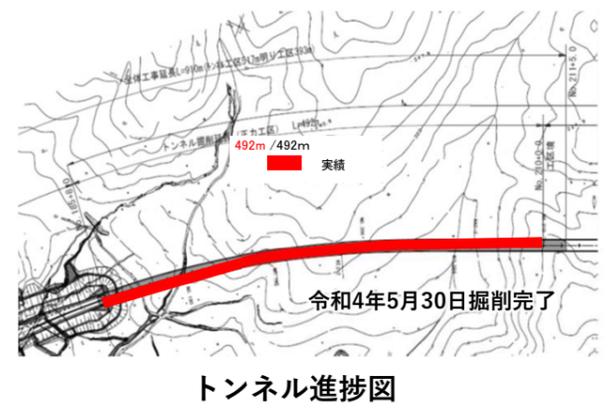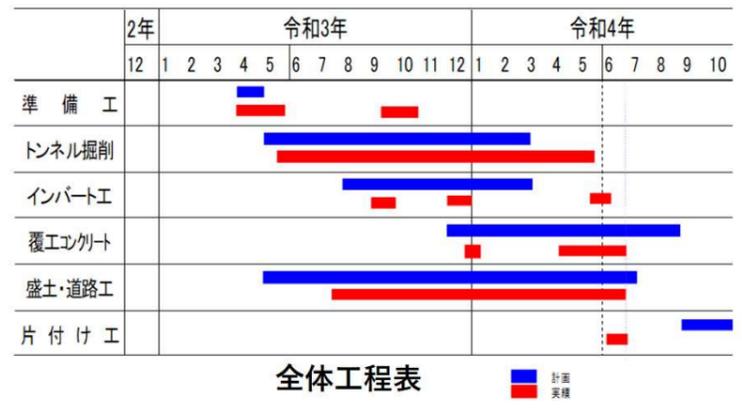

ヤード全景（坑口部）



ヤード全景（仮設ヤード）



ヤード全景（工事起点より）



ヤード全景（右側より）



明かり構造物施工状況



覆工コンクリート施工場所



覆工コンクリート施工完了区間



防水工施工場所



中央排水工施工状況
